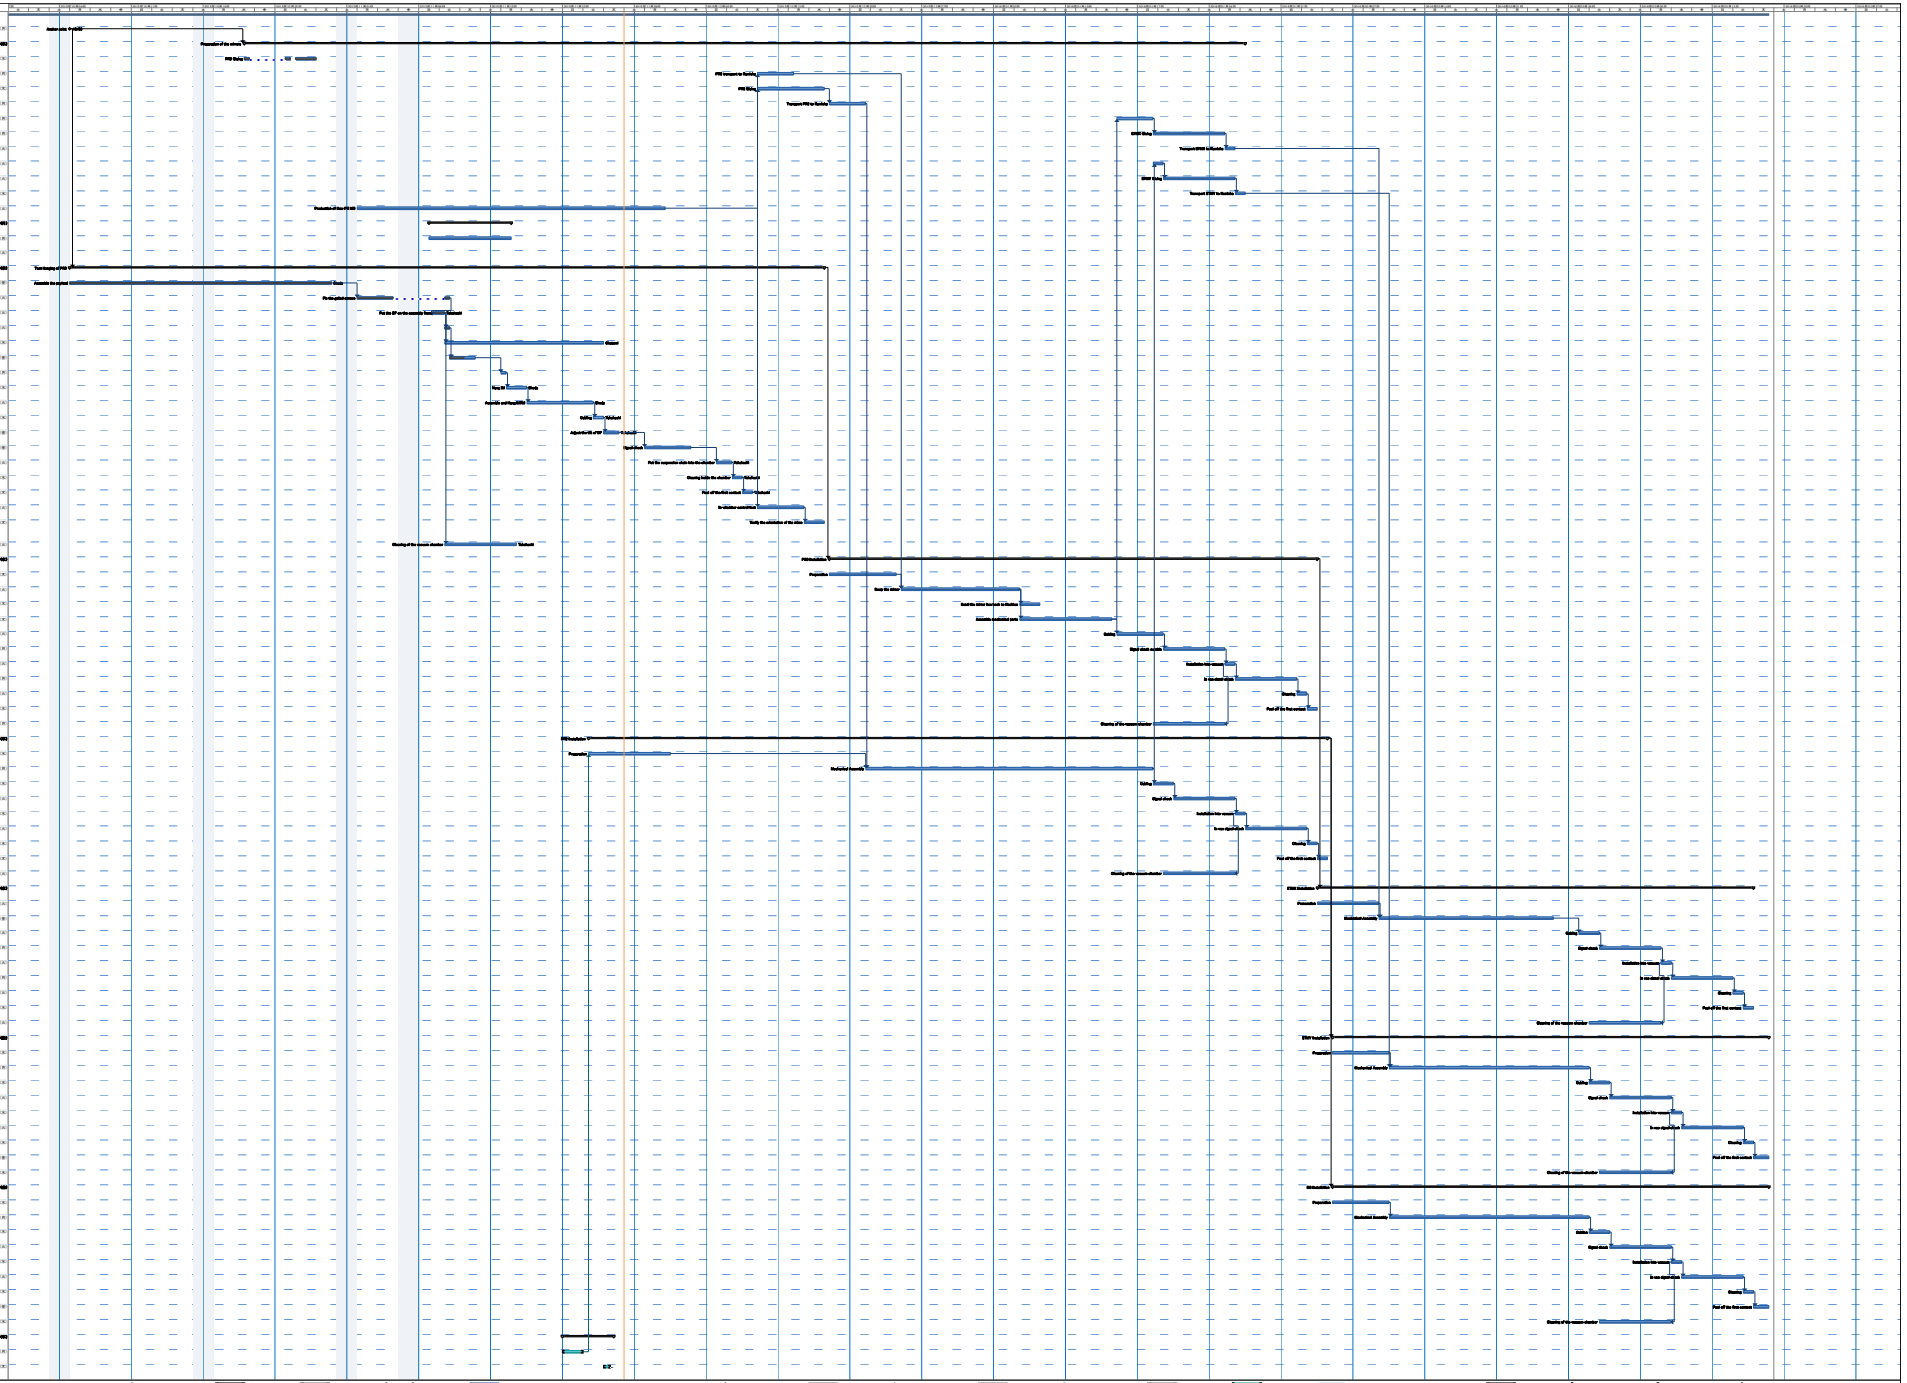1		WBS		01/10/2012	
2		Anchor point	0days	01/10/2012 (月)	01/10/2012 (月)
3		**Preparation of the mirrors**	**17.5days**	**01/10/2012 (月)**	**01/31/2012 (日)**
4		PM2 Gluing	2days	01/10/2012 (月)	01/11/2012 (火)
5		PM2 transport to Kashiwa	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
6		PM2 Gluing	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
7		Transport PM2 to Kashiwa	1day	01/13/2012 (木)	01/13/2012 (木)
8		Move BM3 back to Kashiwa	1day	01/10/2012 (月)	01/10/2012 (月)
9		ETM5 Gluing	2days	01/10/2012 (月)	01/11/2012 (火)
10		Transport ETM5 to Kashiwa	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
11		Move BM3 back to Kashiwa	1day	01/10/2012 (月)	01/10/2012 (月)
12		ETM1 Gluing	2days	01/10/2012 (月)	01/11/2012 (火)
13		Transport ETM1 to Kashiwa	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
14		Production of New PR type	15days	01/10/2012 (月)	01/31/2012 (火)
15		**ETM Preparation**	**5days**	**01/11/2012 (火)**	**01/15/2012 (日)**
16		Decide on the overall procedure	1wk	01/11/2012 (火)	01/11/2012 (火)
17		ICS Preparation	4days?	01/12/2012 (水)	01/15/2012 (日)
18		**Test Hanging of PR3**	**11.5days**	**01/24/2012 (火)**	**01/31/2012 (日)**
19		Assemble into payload	5days	01/10/2012 (月)	01/14/2012 (金)
20		Fix the gilded screws	1days	01/10/2012 (月)	01/11/2012 (火)
21		Put the BF on the assembly frame	1day	01/10/2012 (月)	01/11/2012 (火)
22		OSEM signal check	0.5days	01/11/2012 (火)	01/11/2012 (火)
23		Digital Model Preparation	2days	01/11/2012 (火)	01/12/2012 (水)
24		Trouble shoot the BF weight problem	2days	01/11/2012 (火)	01/12/2012 (水)
25		Prepare baked weights	0.5days	01/11/2012 (火)	01/11/2012 (火)
26		Hang IM	1days	01/11/2012 (火)	01/11/2012 (火)
27		Assemble and Hang OSEM	2days	01/11/2012 (火)	01/12/2012 (水)
28		Cabling	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
29		Adjust the tilt of BF	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
30		Signal check	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
31		Put the suspension chain into the chamber	0.5days	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
32		Closing inside the chamber	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
33		Pump off the first contact	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
34		In-chamber control test	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
35		Verify the orientation of the mirror	2days	01/13/2012 (木)	01/13/2012 (木)
36		Closing of the vacuum chamber	2days	01/11/2012 (火)	01/11/2012 (火)
37		**PR3 Installation**	**2.5days**	**01/27/2012 (金)**	**01/31/2012 (日)**
38		Preparation	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
39		Swap the mirror	2days	01/23/2012 (月)	01/25/2012 (水)
40		Send the mirror box back to Kashiwa	2days	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
41		Assemble mechanical parts	2days	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
42		Cabling	2days	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
43		Signal check outside	2days	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
44		Installation into vacuum	1day	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
45		In vac signal check	2days	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
46		Cleaning	1day	01/27/2012 (金)	01/27/2012 (金)
47		Pump off the first contact	1day	01/27/2012 (金)	01/27/2012 (金)
48		Closing of the vacuum chamber	2days	01/25/2012 (水)	01/27/2012 (金)
49		**PR2 Installation**	**2.5days**	**01/11/2012 (火)**	**01/13/2012 (木)**
50		Preparation	2days	01/11/2012 (火)	01/12/2012 (水)
51		Mechanical Assembly	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
52		Cabling	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
53		Signal check	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
54		Installation into vacuum	1day	01/12/2012 (水)	01/12/2012 (水)
55		In vac signal check	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
56		Cleaning	1day	01/13/2012 (木)	01/13/2012 (木)
57		Pump off the first contact	1day	01/13/2012 (木)	01/13/2012 (木)
58		Closing of the vacuum chamber	2days	01/12/2012 (水)	01/13/2012 (木)
59		**ETM5 Installation**	**2.5days**	**01/13/2012 (木)**	**01/15/2012 (日)**
60		Preparation	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
61		Mechanical Assembly	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
62		Cabling	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
63		Signal check	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
64		Installation into vacuum	1day	01/13/2012 (木)	01/13/2012 (木)
65		In vac signal check	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
66		Cleaning	1day	01/14/2012 (金)	01/14/2012 (金)
67		Pump off the first contact	1day	01/14/2012 (金)	01/14/2012 (金)
68		Closing of the vacuum chamber	2days	01/13/2012 (木)	01/14/2012 (金)
69		**ETM1 Installation**	**2.5days**	**01/14/2012 (金)**	**01/16/2012 (月)**
70		Preparation	2days	01/14/2012 (金)	01/15/2012 (日)
71		Mechanical Assembly	2days	01/14/2012 (金)	01/15/2012 (日)
72		Cabling	2days	01/14/2012 (金)	01/15/2012 (日)
73		Signal check	2days	01/14/2012 (金)	01/15/2012 (日)
74		Installation into vacuum	1day	01/14/2012 (金)	01/14/2012 (金)
75		In vac signal check	2days	01/14/2012 (金)	01/15/2012 (日)
76		Cleaning	1day	01/15/2012 (日)	01/15/2012 (日)
77		Pump off the first contact	1day	01/15/2012 (日)	01/15/2012 (日)
78		Closing of the vacuum chamber	2days	01/14/2012 (金)	01/15/2012 (日)
79		**SR Installation**	**2.5days**	**01/15/2012 (日)**	**01/17/2012 (火)**
80		Preparation	2days	01/15/2012 (日)	01/16/2012 (月)
81		Mechanical Assembly	2days	01/15/2012 (日)	01/16/2012 (月)
82		Cabling	2days	01/15/2012 (日)	01/16/2012 (月)
83		Signal check	2days	01/15/2012 (日)	01/16/2012 (月)
84		Installation into vacuum	1day	01/15/2012 (日)	01/15/2012 (日)
85		In vac signal check	2days	01/15/2012 (日)	01/16/2012 (月)
86		Cleaning	1day	01/16/2012 (月)	01/16/2012 (月)
87		Pump off the first contact	1day	01/16/2012 (月)	01/16/2012 (月)
88		Closing of the vacuum chamber	2days	01/15/2012 (日)	01/16/2012 (月)
89		**Other Tasks**	**5days**	**01/11/2012 (火)**	**01/15/2012 (日)**
90		PR clean bench check	2days	01/11/2012 (火)	01/12/2012 (水)
91		Floor cleaning	1day	01/11/2012 (火)	01/11/2012 (火)
