ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日	先行タスク
1			**VIS**				
2			Anchor point	0days	15/10/05 (月)	15/10/05 (月)	
3			**Preparation of the mirrors**	**42.5days**	**15/10/05 (月)**	**15/12/18 (金)**	**2**
4			PR3 Gluing	3days	15/10/22 (木)	15/10/27 (火)	
5			PR3 transport to Kamioka	1day	15/11/24 (火)	15/11/25 (水)	10
6			PR2 Gluing	4days	15/11/02 (月)	15/11/09 (月)	
7			Transport PR2 to Kamioka	1day	15/12/17 (木)	15/12/18 (金)	6,31
8			ETMX Gluing	4days	15/11/09 (月)	15/11/16 (月)	6
9			Transport ETMX to Kamioka	1day	15/10/05 (月)	15/10/05 (月)	
10			ETMY Gluing	4days	15/11/16 (月)	15/11/24 (火)	8
11			Transport ETMY to Kamioka	1day	15/10/05 (月)	15/10/05 (月)	
12			Production of New PR MB	16days	15/11/02 (月)	15/12/01 (火)	
13			**Test Hanging of PR3**	**34.5days**	**15/10/05 (月)**	**15/12/04 (金)**	**2**
14			Assemble the payload	16days	15/10/05 (月)	15/10/30 (金)	
15			Fix the galled screws	1day	15/11/02 (月)	15/11/02 (月)	14
16			Put the BF on the assembly frame	1day	15/11/03 (火)	15/11/03 (火)	15
17			Hang IM	1day	15/11/04 (水)	15/11/04 (水)	16
18			Assemble and Hang IMRM	2days	15/11/05 (木)	15/11/10 (火)	17
19			Cabling	2days	15/11/10 (火)	15/11/12 (木)	18
20			Adjust the tilt of BF	1day	15/11/13 (金)	15/11/16 (月)	19
21			Control Test	3days	15/11/16 (月)	15/11/19 (木)	20
22			Put the suspension chain into the	1.5days	15/11/20 (金)	15/11/24 (火)	21
23			Cleaning inside the chamber	1day	15/11/25 (水)	15/11/25 (水)	22
24			Peel off the first contact	1day	15/11/26 (木)	15/11/27 (金)	23
25			In-chamber control test	2days	15/11/30 (月)	15/12/01 (火)	24
26			Verify the orientation of the mirro	2days	15/12/02 (水)	15/12/04 (金)	25
27			Cleaning of the vacuum chamber	4days	15/11/04 (水)	15/11/11 (水)	16
28			**PR3 Installation**	**19days**	**15/12/07 (月)**	**16/01/18 (月)**	**13**
29			Preparation	3days	15/12/07 (月)	15/12/09 (水)	

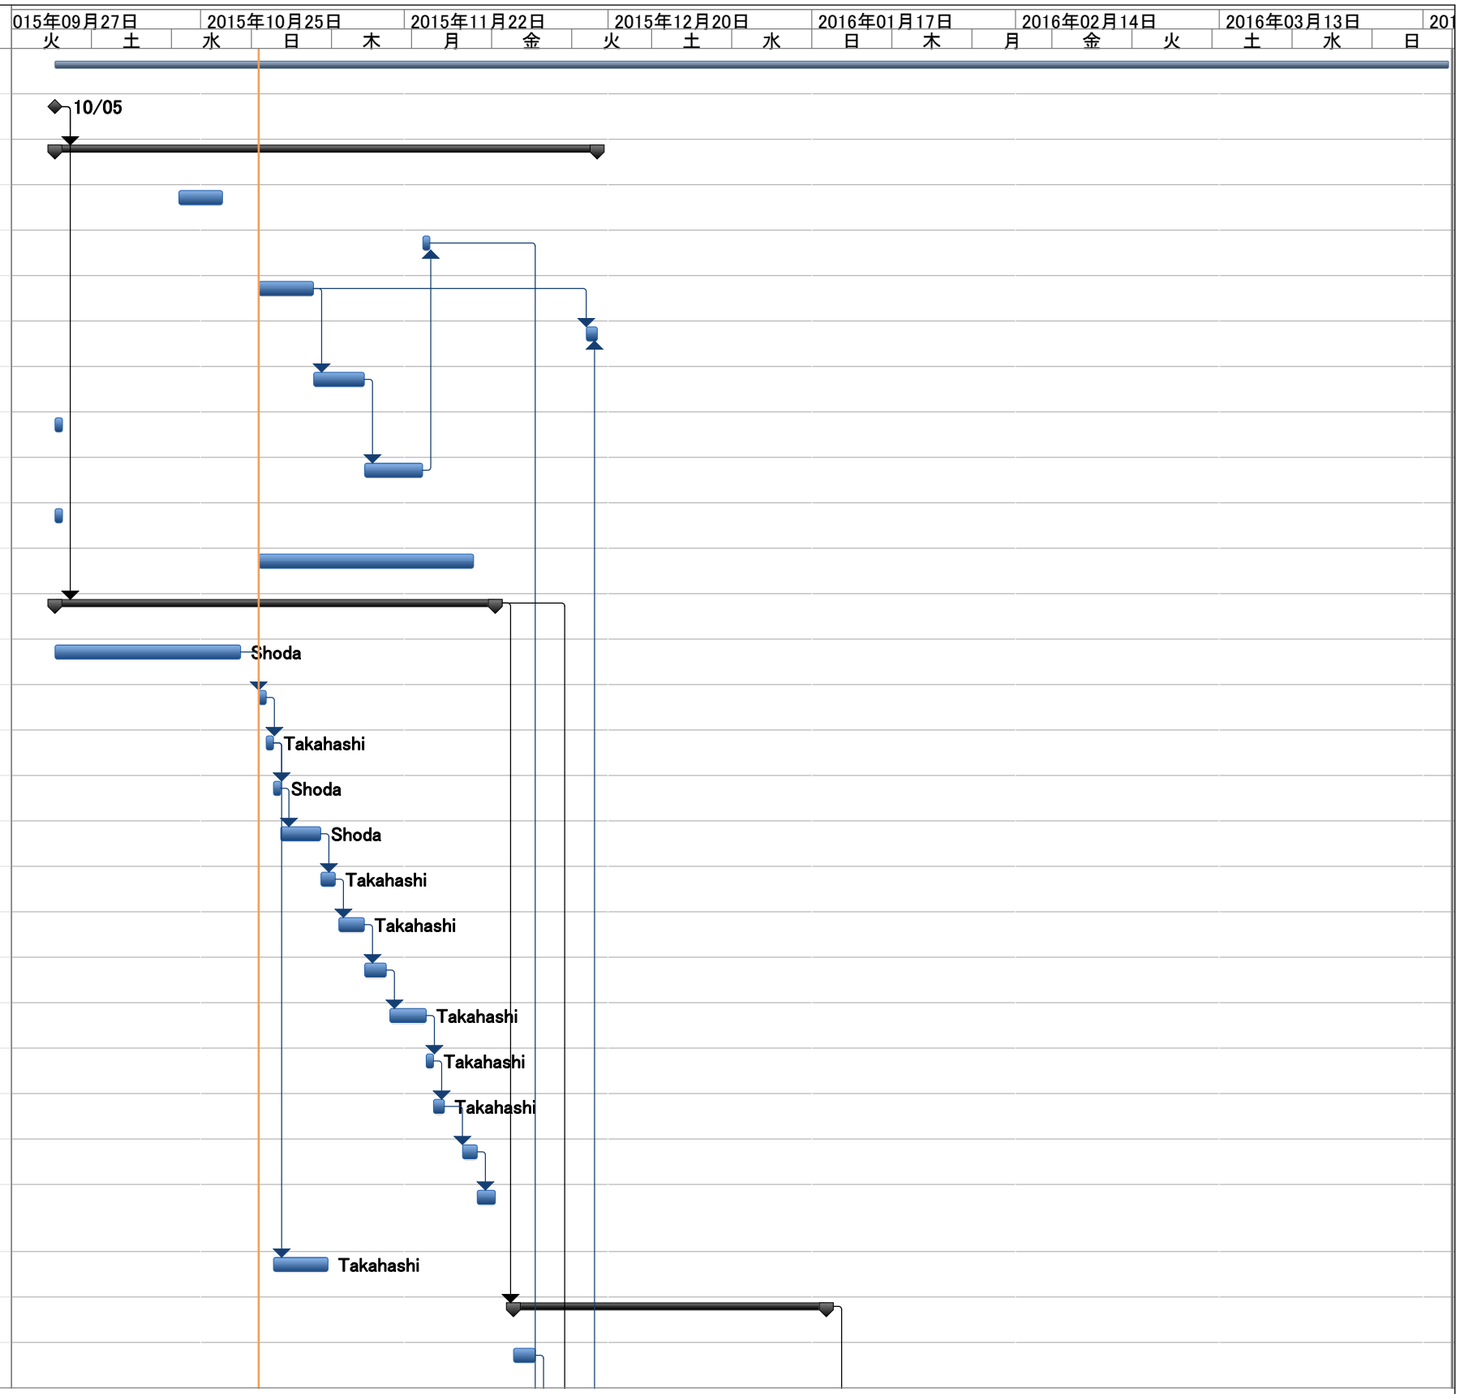

プロジェクト : LCGT Plan Silica RSE
日付 : 15/11/02 (月)

タスク	重ね合わせたタスク	無効なタスク	手動サマリー
分割	重ね合わせた分割	無効なマイルストーン	開始日のみ
マイルストーン	重ね合わせたタスクの進捗状況	無効なサマリー	終了日のみ
サマリー タスク	重ね合わせたマイルストーン	手動タスク	期限
プロジェクトのサマリー	外部タスク	期間のみ	進捗状況
グループ サマリー	外部マイルストーン	手動でのサマリーの重ね合わせ	

ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日	先行タスク
30			Swap the mirror	2days	15/12/10 (木)	15/12/14 (月)	29,5
31			Send the mirror box back to Kashiwa	2days	15/12/15 (火)	15/12/16 (水)	30
32			Assemble mechanical parts	3days	15/12/15 (火)	15/12/18 (金)	30
33			Cabling	2days	15/12/21 (月)	15/12/22 (火)	32
34			Signal check outside	3days	15/12/24 (木)	16/01/05 (火)	33
35			Installation into vacuum	1day	16/01/06 (水)	16/01/06 (水)	34
36			In vac signal check	3days	16/01/07 (木)	16/01/13 (水)	35
37			Cleaning	1day	16/01/14 (木)	16/01/15 (金)	36
38			Peel off the first contact	1day	16/01/18 (月)	16/01/18 (月)	37
39			Cleaning of the vacuum chamber	4days	15/12/22 (火)	16/01/06 (水)	35SF
40			**PR2 Installation**	**24days**	**15/12/15 (火)**	**16/02/03 (水)**	**13FS+1wk**
41			Preparation	3days	15/12/15 (火)	15/12/18 (金)	
42			Mechanical Assembly	10days	15/12/21 (月)	16/01/15 (金)	41
43			Cabling	2days	16/01/18 (月)	16/01/19 (火)	42
44			Signal check	3days	16/01/20 (水)	16/01/25 (月)	43
45			Installation into vacuum	1day	16/01/26 (火)	16/01/26 (火)	44
46			In vac signal check	3days	16/01/27 (水)	16/02/01 (月)	45
47			Cleaning	1day	16/02/02 (火)	16/02/02 (火)	46
48			Peel off the first contact	1day	16/02/03 (水)	16/02/03 (水)	47
49			Cleaning of the vacuum chamber	4days	16/01/19 (火)	16/01/26 (火)	45SF
50			**BS Installation**	**24days**	**16/01/19 (火)**	**16/03/01 (火)**	**28**
51			Preparation	3days	16/01/19 (火)	16/01/22 (金)	
52			Mechanical Assembly	10days	16/01/25 (月)	16/02/09 (火)	51
53			Cabling	2days	16/02/10 (水)	16/02/15 (月)	52
54			Signal check	3days	16/02/15 (月)	16/02/18 (木)	53
55			Installation into vacuum	1day	16/02/19 (金)	16/02/22 (月)	54
56			In vac signal check	3days	16/02/22 (月)	16/02/25 (木)	55
57			Cleaning	1day	16/02/26 (金)	16/02/29 (月)	56
58			Peel off the first contact	1day	16/02/29 (月)	16/03/01 (火)	57
59			Cleaning of the vacuum chamber	4days	16/02/12 (金)	16/02/19 (金)	55SF

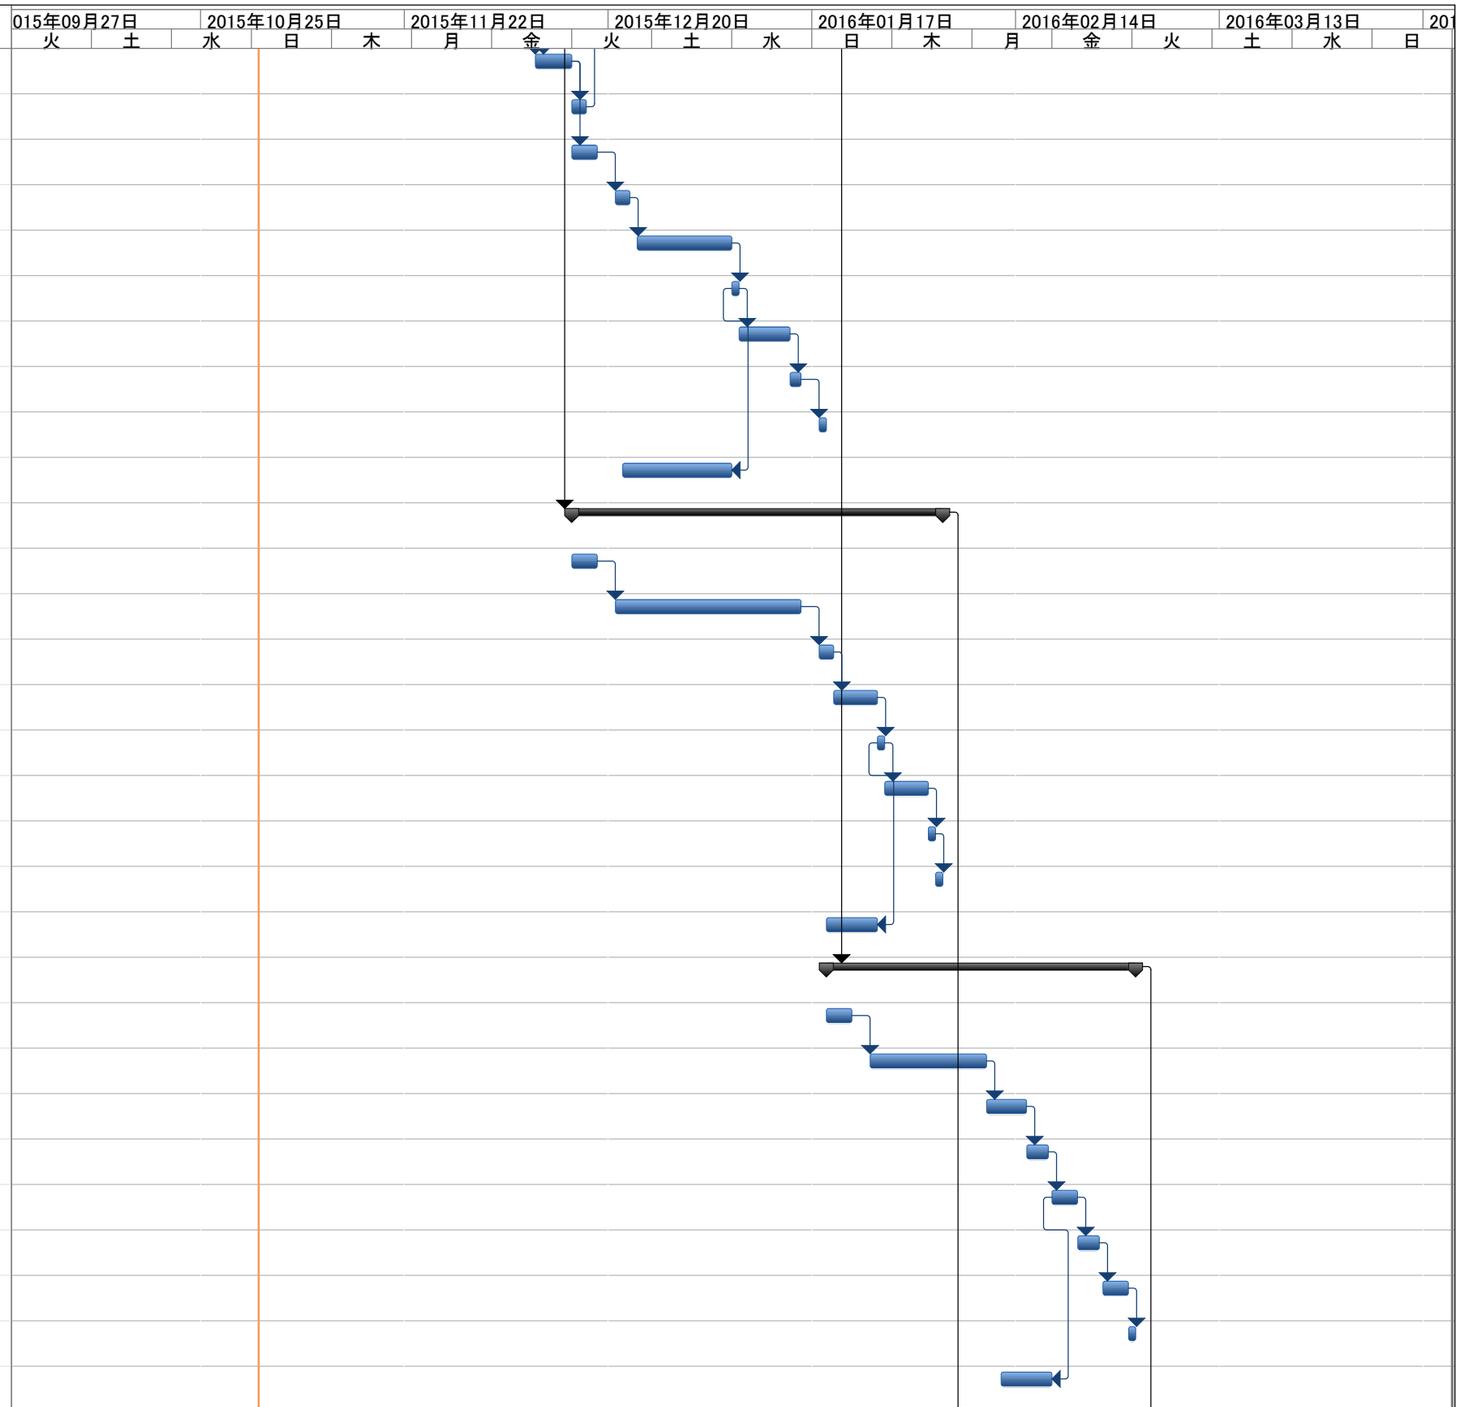

プロジェクト : LCGT Plan Silica RSE
日付 : 15/11/02 (月)

タスク	重ね合わせたタスク	無効なタスク	手動サマリー
分割	重ね合わせた分割	無効なマイルストーン	開始日のみ
マイルストーン	重ね合わせたタスクの進捗状況	無効なサマリー	終了日のみ
サマリー タスク	重ね合わせたマイルストーン	手動タスク	期限
プロジェクトのサマリー	外部タスク	期間のみ	進捗状況
グループ サマリー	外部マイルストーン	手動でのサマリーの重ね合わせ	

ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日	先行タスク
60			**ETMX Installation**	**24days**	**16/02/04 (木)**	**16/03/17 (木)**	**40**
61			Preparation	3days	16/02/04 (木)	16/02/09 (火)	
62			Mechanical Assembly	10days	16/02/10 (水)	16/02/29 (月)	61
63			Cabling	2days	16/02/29 (月)	16/03/02 (水)	62
64			Signal check	3days	16/03/02 (水)	16/03/08 (火)	63
65			Installation into vacuum	1day	16/03/08 (火)	16/03/09 (水)	64
66			In vac signal check	3days	16/03/09 (水)	16/03/15 (火)	65
67			Cleaning	1day	16/03/15 (火)	16/03/16 (水)	66
68			Peel off the first contact	1day	16/03/16 (水)	16/03/17 (木)	67
69			Cleaning of the vacuum chamber	4days	16/03/01 (火)	16/03/08 (火)	65SF
70			**ETMY Installation**	**24days**	**16/03/01 (火)**	**16/04/13 (水)**	**50**
71			Preparation	3days	16/03/01 (火)	16/03/07 (月)	
72			Mechanical Assembly	10days	16/03/07 (月)	16/03/24 (木)	71
73			Cabling	2days	16/03/25 (金)	16/03/29 (火)	72
74			Signal check	3days	16/03/29 (火)	16/04/04 (月)	73
75			Installation into vacuum	1day	16/04/04 (月)	16/04/05 (火)	74
76			In vac signal check	3days	16/04/05 (火)	16/04/11 (月)	75
77			Cleaning	1day	16/04/11 (月)	16/04/12 (火)	76
78			Peel off the first contact	1day	16/04/12 (火)	16/04/13 (水)	77
79			Cleaning of the vacuum chamber	4days	16/03/28 (月)	16/04/04 (月)	75SF

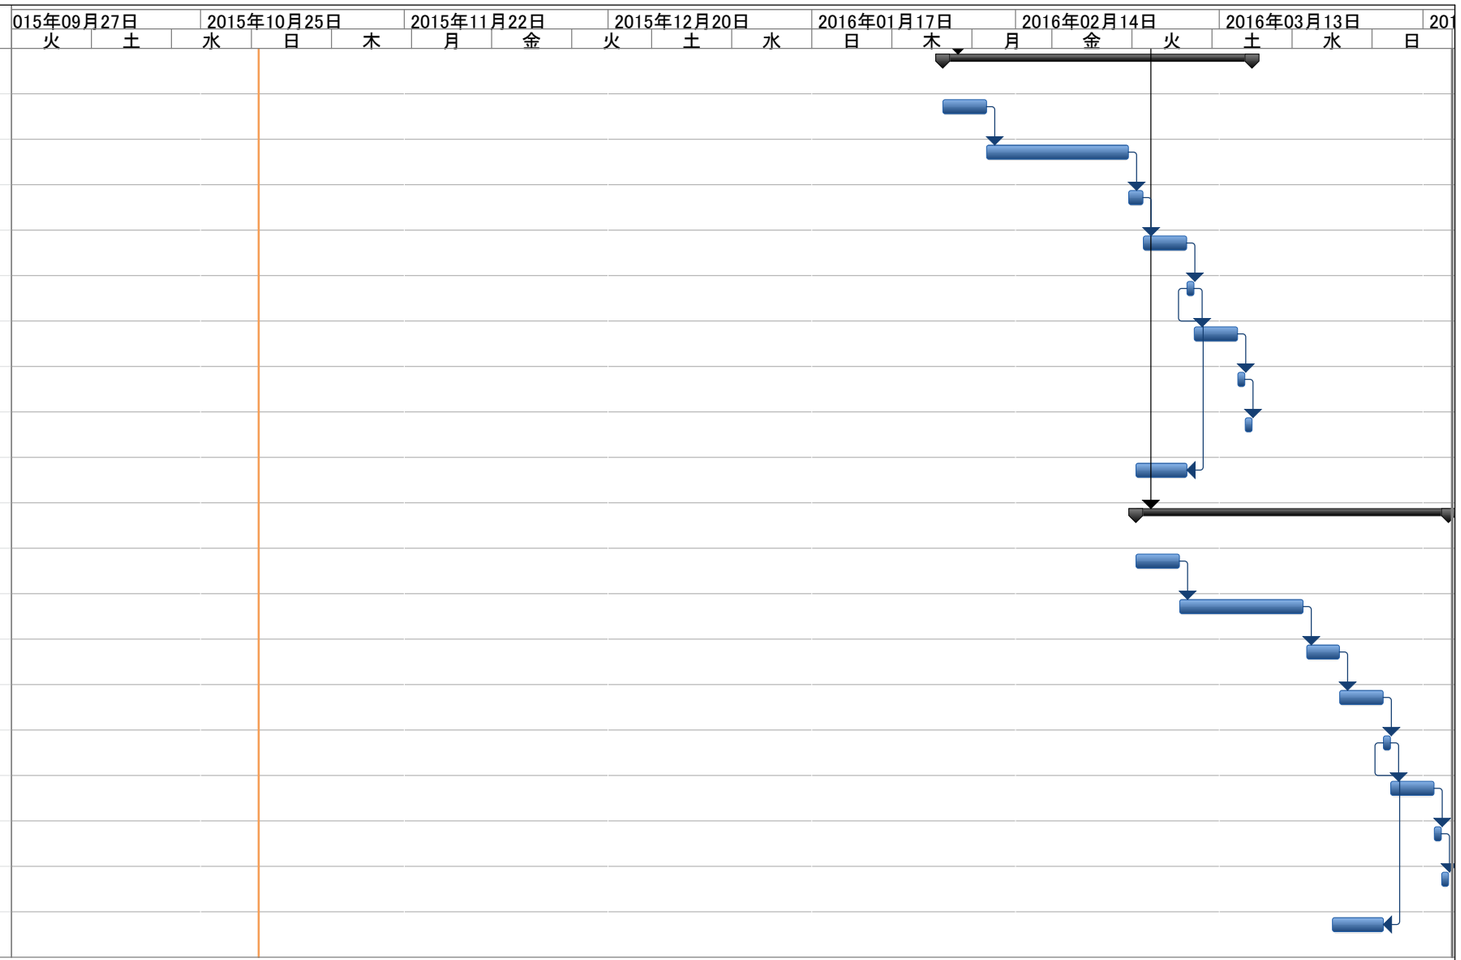

プロジェクト : LCGT Plan Silica RSE
日付 : 15/11/02 (月)

タスク	重ね合わせたタスク	無効なタスク	手動サマリー
分割	重ね合わせた分割	無効なマイルストーン	開始日のみ
マイルストーン	重ね合わせたタスクの進捗状況	無効なサマリー	終了日のみ
サマリー タスク	重ね合わせたマイルストーン	手動タスク	期限
プロジェクトのサマリー	外部タスク	期間のみ	進捗状況
グループ サマリー	外部マイルストーン	手動でのサマリーの重ね合わせ	
