ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日
1			前提0: とりあえずiLCGTだけをつくることを考える。	0日	11/11/24 (木)	11/11/24 (木)
2			前提1 :主干渉計の光学パラメータや配置が定まる(MIFなど)	30日	11/11/24 (木)	12/01/04 (水)
3			前提2: Viewportのすべての配置が定まる。(VACな	30日	11/11/24 (木)	12/01/04 (水)
4			前提3: そのほか、懸架系の脚など、制約条件が定まる。(VISなど)	30日	11/11/24 (木)	12/01/04 (水)
5						
6			**Stray Light Control 1**	**844日**	**12/01/05 (木)**	**15/03/31 (火)**
7			**配置の決定**	**178日**	**12/01/05 (木)**	**12/09/10 (月)**
8			光線追跡	80日	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
9			全てのバッフルの幾何学的な形状設計とそのZemax上での配置・確認	70日	12/04/26 (木)	12/08/01 (水)
10			調整予備期間、確定	28日	12/08/02 (木)	12/09/10 (月)
11			**バッフルのインストール**	**666日**	**12/09/11 (火)**	**15/03/31 (火)**
12			バッフルおよび支持系の図面作成	180日	12/09/11 (火)	13/05/20 (月)
13			仕様書作成	70日	13/05/21 (火)	13/08/26 (月)
14			調達作業	155日	13/08/27 (火)	14/03/31 (月)
15			インストール作業	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)

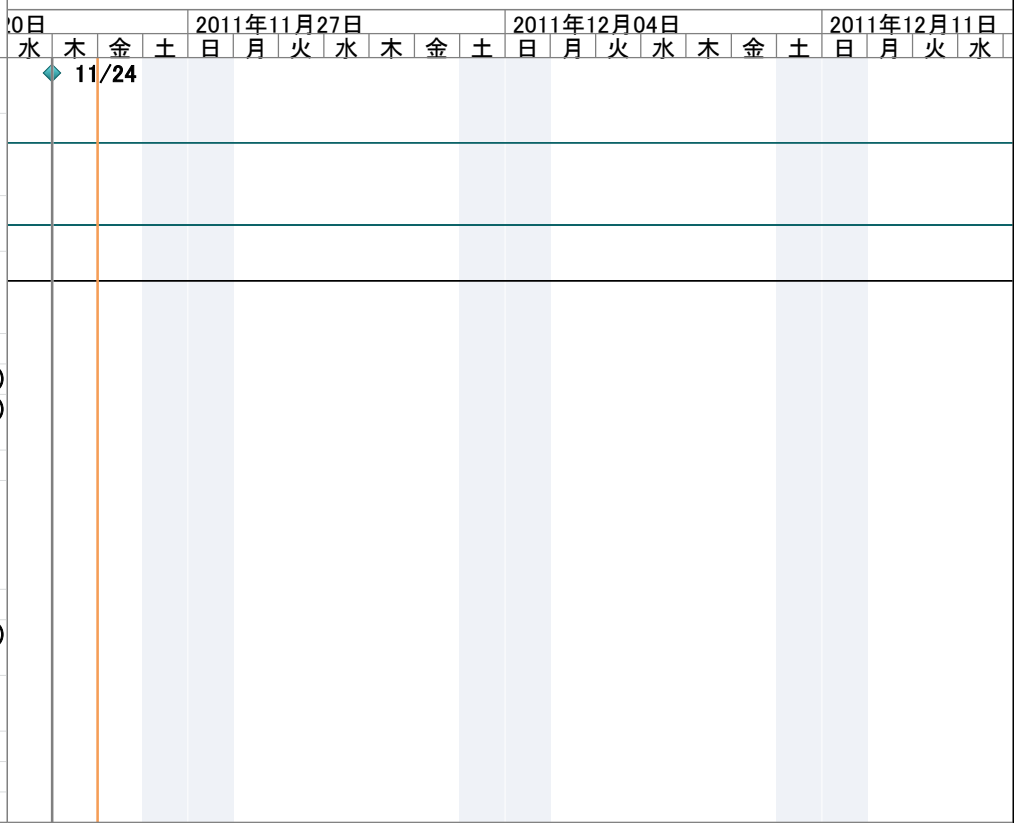

プロジェクト : LCGT_AOS_20111124
日付 : 11/11/25 (金)

タスク		無効なタスク	
分割		無効なマイルストーン	
マイルストーン		無効なサマリー	
サマリー タスク		手動タスク	
プロジェクトのサマリー		期間のみ	
グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
重ね合わせたタスク		手動サマリー	
重ね合わせた分割		開始日のみ	
重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
重ね合わせたマイルストーン		期限	
外部タスク		進捗状況	
外部マイルストーン			

ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日
16						
17			**Stray Light Control 2**	**1日?**	**11/11/24 (木)**	**11/11/24 (木)**
18			主干渉計光学系の BRDFの推計			
19						
20			**Beam Reducing Telescopes**	**844日**	**12/01/05 (木)**	**15/03/31 (火)**
21			**配置の決定**	**178日**	**12/01/05 (木)**	**12/09/10 (月)**
22			光線追跡	80日	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
23			Telescope光学系を Zemax上に配置	70日	12/04/26 (木)	12/08/01 (水)
24			調整予備期間、確定	28日	12/08/02 (木)	12/09/10 (月)
25			**インストレーション**	**666日**	**12/09/11 (火)**	**15/03/31 (火)**
26			図面作成	180日	12/09/11 (火)	13/05/20 (月)
27			仕様書作成	70日	13/05/21 (火)	13/08/26 (月)
28			調達作業	155日	13/08/27 (火)	14/03/31 (月)
29			インストール作業	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)
30						
31			**Optical Levers**	**844日**	**12/01/05 (木)**	**15/03/31 (火)**
32			**配置の決定**	**178日**	**12/01/05 (木)**	**12/09/10 (月)**
33			光線追跡	80日	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
34			Optical Leverを Zemax上に配置	70日	12/04/26 (木)	12/08/01 (水)
35			調整予備期間、確定	28日	12/08/02 (木)	12/09/10 (月)
36			**インストレーション**	**666日**	**12/09/11 (火)**	**15/03/31 (火)**
37			図面作成	180日	12/09/11 (火)	13/05/20 (月)

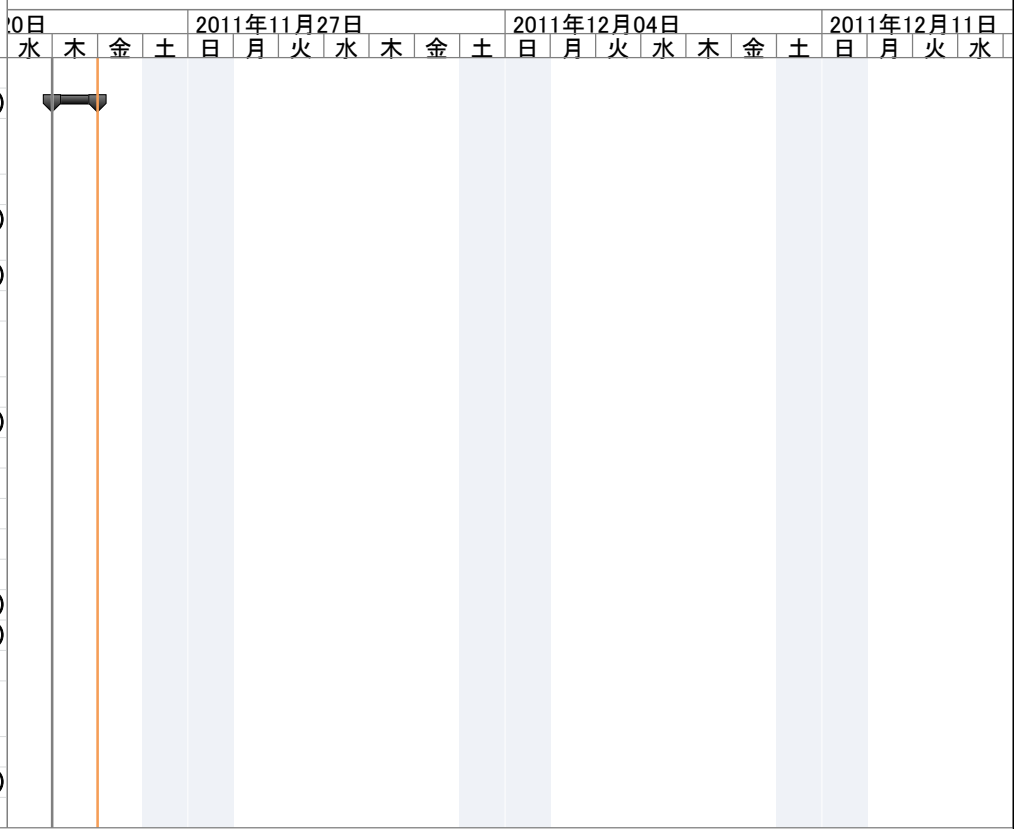

プロジェクト : LCGT_AOS_20111124
日付 : 11/11/25 (金)

タスク		無効なタスク	
分割		無効なマイルストーン	
マイルストーン		無効なサマリー	
サマリー タスク		手動タスク	
プロジェクトのサマリー		期間のみ	
グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
重ね合わせたタスク		手動サマリー	
重ね合わせた分割		開始日のみ	
重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
重ね合わせたマイルストーン		期限	
外部タスク		進捗状況	
外部マイルストーン			

ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日
38			仕様書作成	70日	13/05/21 (火)	13/08/26 (月)
39			調達作業	155日	13/08/27 (火)	14/03/31 (月)
40			インストール作業	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)
41						
42			**Stray Light Control 3**	**1日?**	**11/11/24 (木)**	**11/11/24 (木)**
43			iLCGTではあまり気にしない？			
44			Dark port PDの選定など			
45			Output Faradayなど			
46						
47			**Auxiliary Locking (Green Laser)**	**666日?**	**12/09/10 (月)**	**15/03/31 (火)**
48			**配置の決定**	**80日**	**12/09/10 (月)**	**12/12/31 (月)**
49			BRTの決定時に自動的に決まることになっている。基本的にはbeamの小さくなるミラーのところから入射するつもりなのでBRTいらないのかもしれ	0日	12/09/10 (月)	12/09/10 (月)
50			むしろ、センタールーム近辺での真空槽外の光学配置が重要。	80日	12/09/11 (火)	12/12/31 (月)
51			**インストレーション**	**261日?**	**14/04/01 (火)**	**15/03/31 (火)**
52			たぶん、消耗品だけでなんとかなりそうだけど。。			

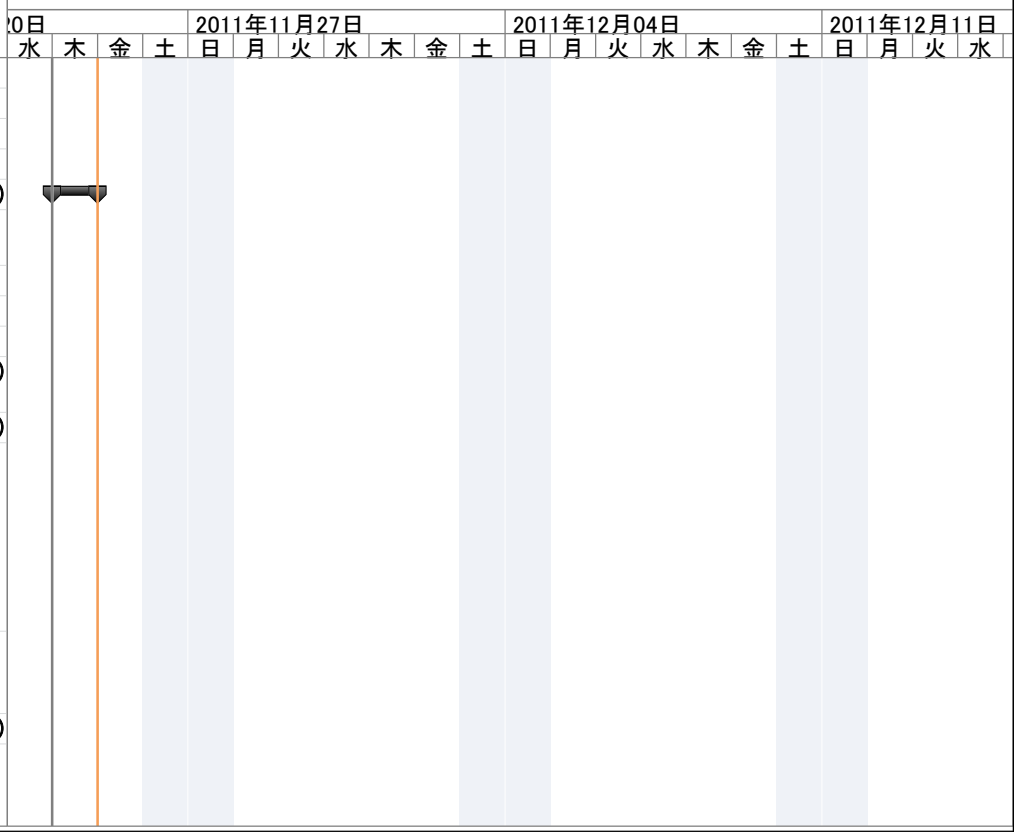

プロジェクト : LCGT_AOS_20111124
日付 : 11/11/25 (金)

タスク		無効なタスク	
分割		無効なマイルストーン	
マイルストーン		無効なサマリー	
サマリー タスク		手動タスク	
プロジェクトのサマリー		期間のみ	
グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
重ね合わせたタスク		手動サマリー	
重ね合わせた分割		開始日のみ	
重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
重ね合わせたマイルストーン		期限	
外部タスク		進捗状況	
外部マイルストーン			

ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日
53			インストール作業	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)
54						
55			Video Monitors (CCD cameras or equiv)	80日?	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
56			配置の決定	80日?	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
57			光線追跡	80日	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
58			真空槽の外、または内部におくべきもののリストアップをしっかりしておくこと。			
59			インストレーション	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)
60			インストール作業	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)
61						
62			Viewports (Room Temp)	844日	12/01/05 (木)	15/03/31 (火)
63			配置の決定	80日	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
64			Zemaxへ反映	80日	12/01/05 (木)	12/04/25 (水)
65			インストレーション	844日	12/01/05 (木)	15/03/31 (火)
66			図面作成	180日	12/01/05 (木)	12/09/12 (水)
67			仕様書作成	70日	12/09/13 (木)	12/12/19 (水)
68			調達作業	155日	12/12/20 (木)	13/07/24 (水)
69			インストール作業	261日	14/04/01 (火)	15/03/31 (火)
70						
71			Initial Alignment			
72			Beam Profiler			
73			Automatic Targets			

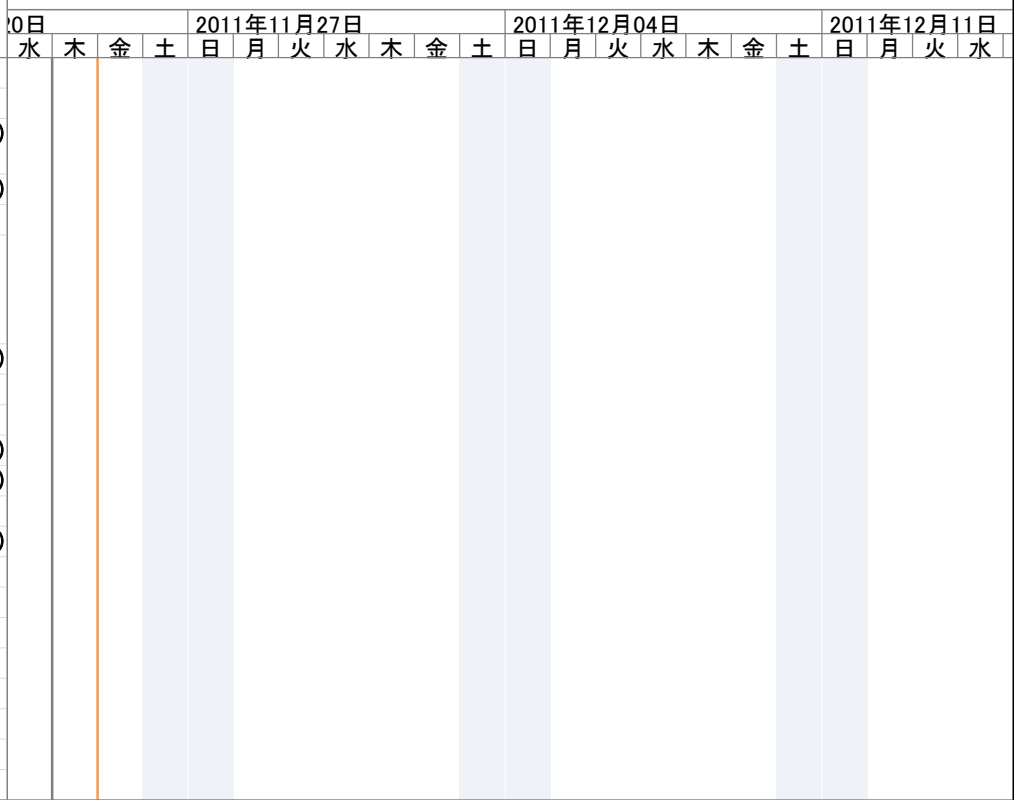

プロジェクト : LCGT_AOS_20111124
日付 : 11/11/25 (金)

タスク		無効なタスク	
分割		無効なマイルストーン	
マイルストーン		無効なサマリー	
サマリー タスク		手動タスク	
プロジェクトのサマリー		期間のみ	
グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
重ね合わせたタスク		手動サマリー	
重ね合わせた分割		開始日のみ	
重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
重ね合わせたマイルストーン		期限	
外部タスク		進捗状況	
外部マイルストーン			
