ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日
1			**DGS**	**2404日?**	**10/09/01 (水)**	**17/03/31 (金)**
2	✓		Standalone system	578日?	10/09/01 (水)	12/03/31 (土)
3	✓		Small network system	731日	11/04/01 (金)	13/03/31 (日)
4			Large network system	730日	12/04/01 (日)	14/03/31 (月)
5			**Full system**	**365日**	**14/04/01 (火)**	**15/03/31 (火)**
6			**Assembling**	**183日?**	**14/04/01 (火)**	**14/09/30 (火)**
7			Test using LNS	174日?	14/04/01 (火)	14/09/21 (日)
8			Release from existing rack	9日?	14/09/22 (月)	14/09/30 (火)
9			**Installation**	**92日**	**14/10/01 (水)**	**14/12/31 (水)**
10			**Rack**	**19日?**	**14/10/01 (水)**	**14/10/19 (日)**
11			Rack installation to mine	12日?	14/10/01 (水)	14/10/12 (日)
12			PDU UPS setup	7日?	14/10/13 (月)	14/10/19 (日)
13			**Computers**	**28日?**	**14/10/20 (月)**	**14/11/16 (日)**
14			**Servers**	**14日**	**14/10/20 (月)**	**14/11/02 (日)**
15			k1boot	3日	14/10/20 (月)	14/10/22 (水)
16			k1dc0	4日	14/10/23 (木)	14/10/26 (日)
17			k1nds0	4日	14/10/27 (月)	14/10/30 (木)
18			k1nds1	4日	14/10/27 (月)	14/10/30 (木)
19			k1fw0	4日	14/10/27 (月)	14/10/30 (木)
20			k1fw1	4日	14/10/27 (月)	14/10/30 (木)
21			k1dm0	3日	14/10/31 (金)	14/11/02 (日)
22			k1dm1	3日	14/10/31 (金)	14/11/02 (日)
23			RT front-end	14日?	14/11/03 (月)	14/11/16 (日)
24			**Network**	**28日?**	**14/11/17 (月)**	**14/12/14 (日)**
25			**Center area**	**12日?**	**14/11/17 (月)**	**14/11/28 (金)**
26			TCP/IP	7日?	14/11/17 (月)	14/11/23 (日)
27			**DAQ**	**3日?**	**14/11/24 (月)**	**14/11/26 (水)**
28			OPEN-MX	3日?	14/11/24 (月)	14/11/26 (水)
29			Myrinet	3日?	14/11/24 (月)	14/11/26 (水)
30			RFM	1日?	14/11/27 (木)	14/11/27 (木)
31			Dolphin	1日?	14/11/27 (木)	14/11/27 (木)
32			timing	1日?	14/11/28 (金)	14/11/28 (金)
33			**X arm**	**7日?**	**14/12/01 (月)**	**14/12/07 (日)**
39			**Y arm**	**7日?**	**14/12/08 (月)**	**14/12/14 (日)**
45			**Timing**	**7日?**	**14/12/15 (月)**	**14/12/21 (日)**
52			**Front room**	**1日?**	**14/12/22 (月)**	**14/12/22 (月)**
53			Client workstation	1日?	14/12/22 (月)	14/12/22 (月)
54			**Control room**	**28日**	**15/01/05 (月)**	**15/02/01 (日)**
55			Client workstation	1日?	15/01/11 (日)	15/01/11 (日)
56			Upgrade to RSE	365日	16/04/01 (金)	17/03/31 (金)

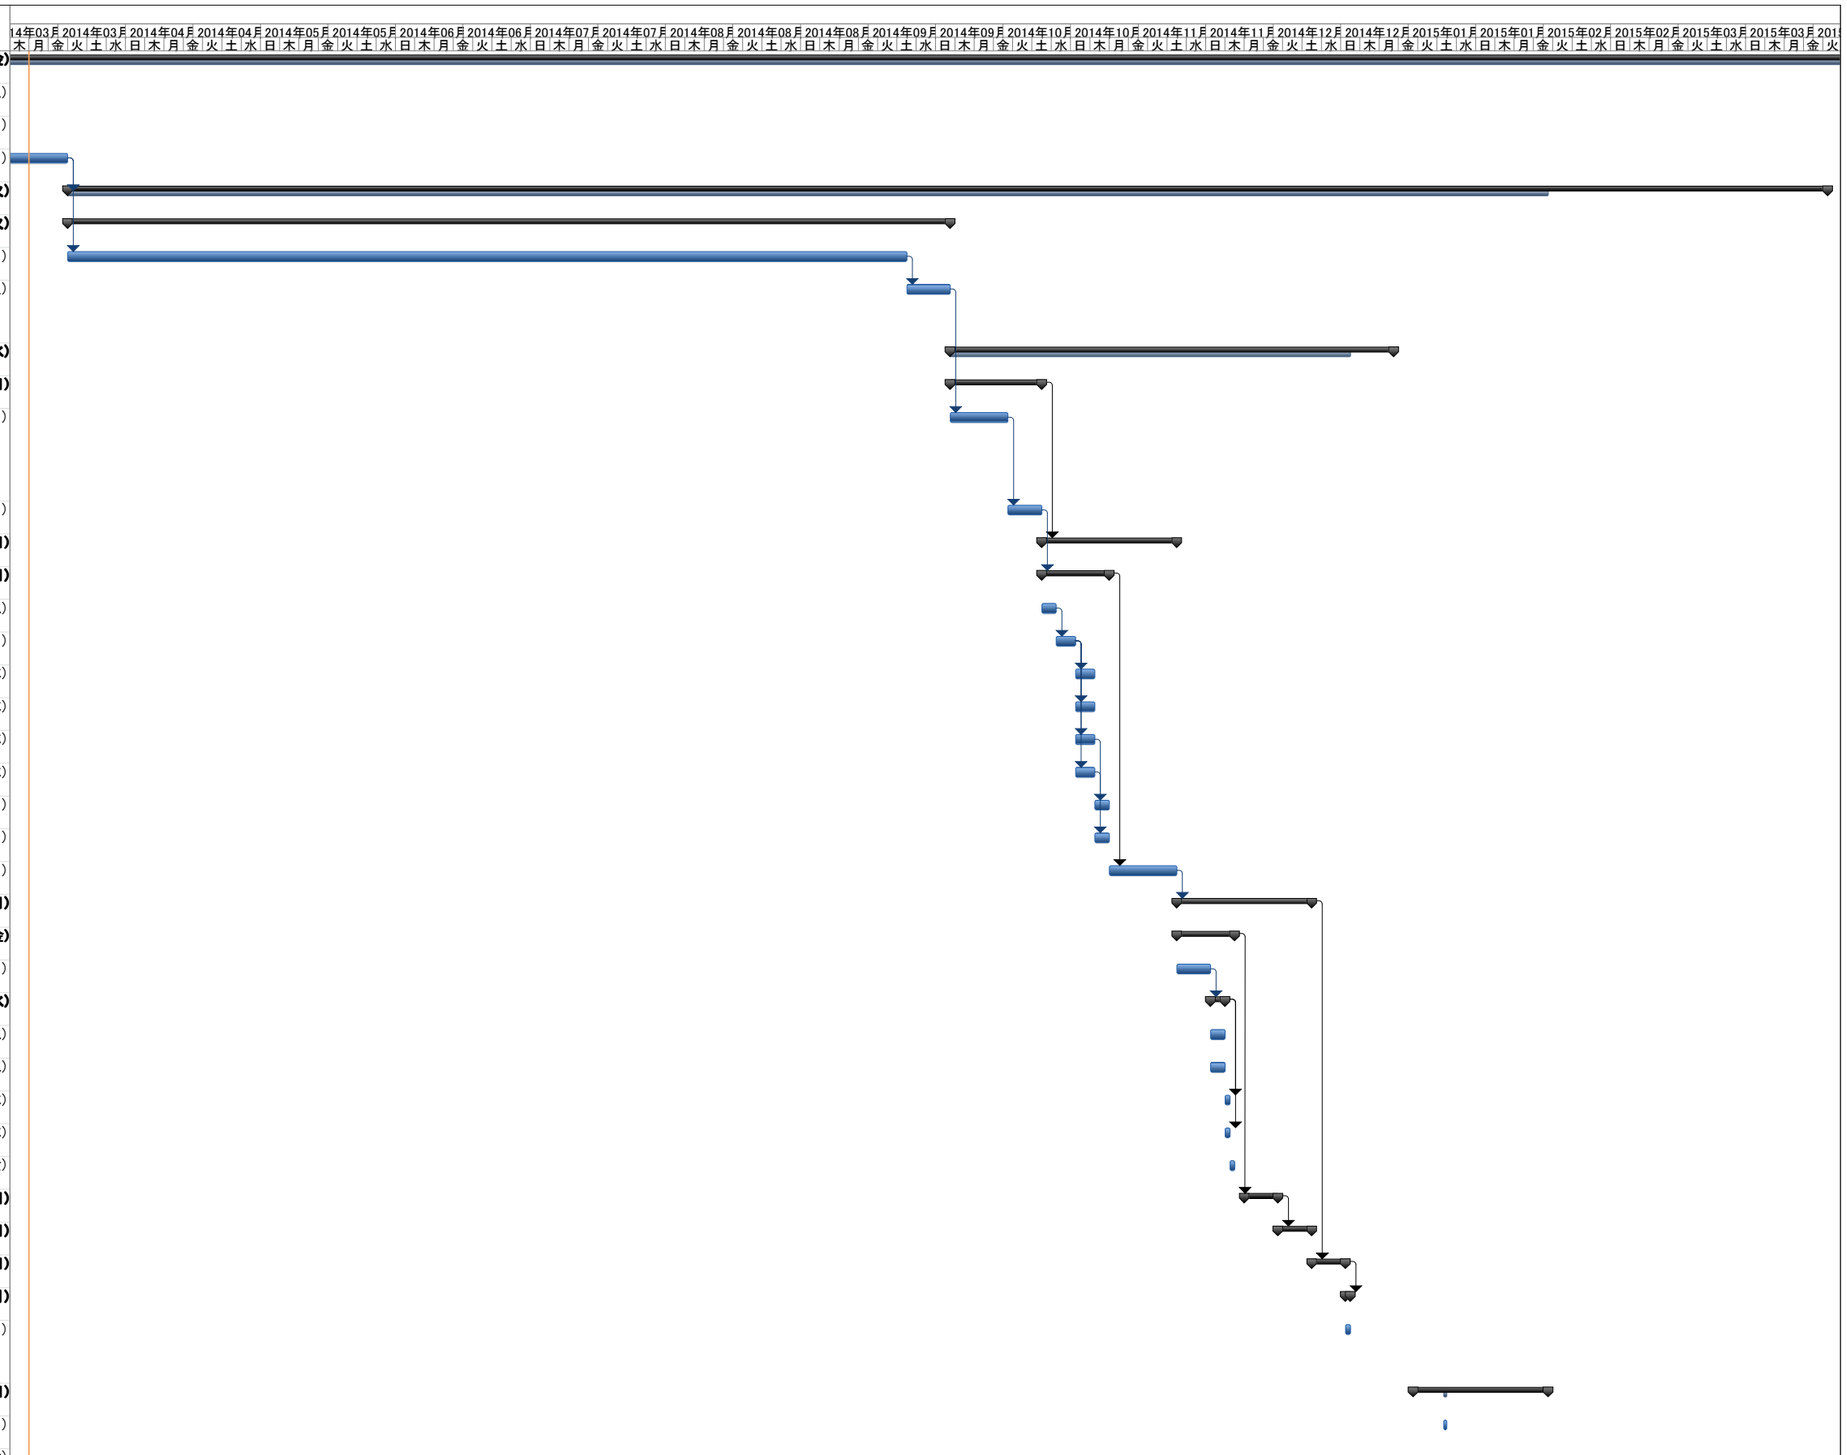

プロジェクト : LCGT Plan Silica RSE
日付 : 14/03/24 (月)

タスク / 分割 / マイルストーン / サマリー タスク
プロジェクトのサマリー / グループ サマリー / 重ね合わせたタスク / 重ね合わせた分割
重ね合わせたタスクの進捗状況 / 重ね合わせたマイルストーン / 外部タスク / 外部マイルストーン
無効なタスク / 無効なマイルストーン / 無効なサマリー / 手動タスク
期間のみ / 手動でのサマリーの重ね合わせ / 手動サマリー / 開始日のみ
終了日のみ / 期限 / 進捗状況
